

DESTINO DEL GASTO SRFT 3ER. TRIM. 2024

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2379202

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$299,345.26 + Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|--|--|--|--------------|---|---|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$299,345.26 | \$299,345.26 ✔ | ✖ Eliminar |

Avance Financiero

+ Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| 2024 / ABR-JUN | \$299,345.26 | \$299,345.26 | \$153,148.43 | \$153,148.43 | \$153,148.43 | 51.16% | ✓ Confirmado |
| 2024 / JUL-SEP | \$299,345.26 | \$299,345.26 | \$299,345.26 | \$299,345.26 | \$299,345.26 | 100.00% | ✎ Editar |

Avances Físicos

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2379202

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doramoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

+ Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|--|---|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-46-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | \$299,345.26 | \$299,345.26 | 🔗 Ver detalles | ✖ Eliminar |

✖ Cancelar
← Anterior
Guardar y Continuar →

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240202379202

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

28°C Soleado

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | |
|---|--|
| Nombre REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, XILITLA S.L.P. - 106138 | Estado Responsable San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable Xilitla |
| Clasificación del registro Salud | Institución Ejecutora Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro Sin identificar | Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| Periodo de ejecución 26/03/2024 - 20/05/2024 | Mujeres 153 |
| Número de Registro 106138 | Hombres 132 |

28°C Soleado

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2379626

\$251,401.16 Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|--------------|--------------|-----------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$251,401.16 | \$251,401.16 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 2024 / ABR-JUN | \$251,401.16 | \$251,401.16 | \$125,252.93 | \$125,252.93 | \$125,252.93 | 49.82% | ✓ Confirmado |
| 2024 / JUL-SEP | \$251,401.16 | \$251,401.16 | \$251,401.16 | \$251,401.16 | \$251,401.16 | 100% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 508.8 Meta Modificada: 508.8 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|---------------------|
| 2024 JUL-SEP | 508.8 | 100% | Editar |
| 2024 ABR-JUN | 257 | 50.51% | ✓ Confirmado |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2379626

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240202379626

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$557,432.22

[Agregar Fuente de Financiamiento](#)

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$557,432.22 | \$557,432.22 | Eliminar |

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| 2024 / JUL-SEP | \$0.00 | \$557,432.22 | \$557,432.22 | \$557,432.22 | \$557,432.22 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 376

Meta Modificada: 376

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|---------|--------|------------|--------|
|---------|--------|------------|--------|

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa



[Buscar por Folio](#)

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-40-2024 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | Municipio de Xilitla | \$557,432.22 | \$557,432.22 | Ver detalles | Eliminar |

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

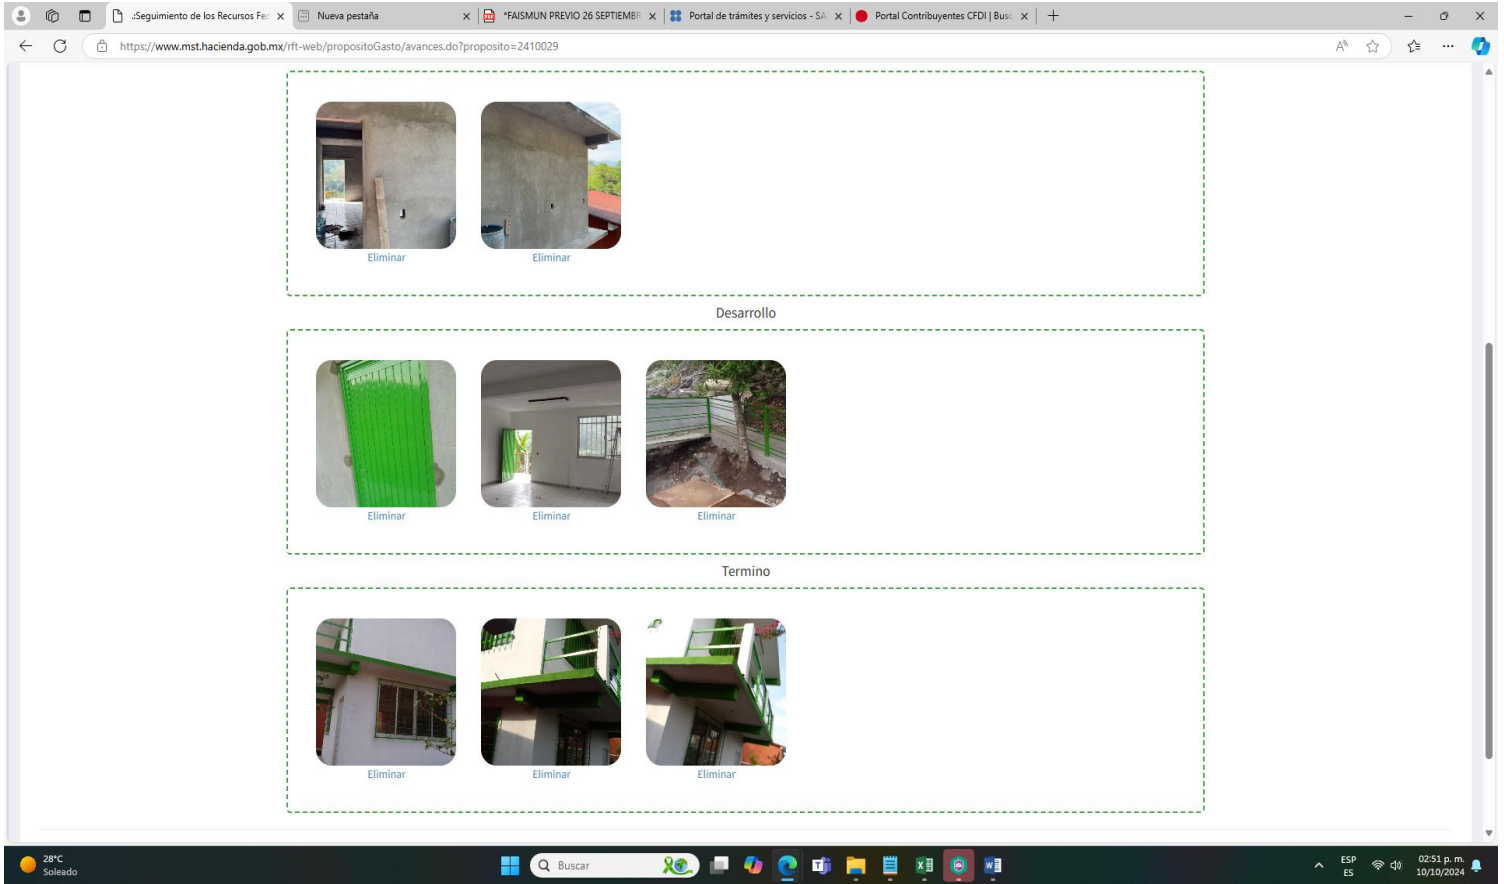

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Observaciones: **capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-59-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | \$699,184.51 | \$699,184.51 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Desarrollo

Termino

Eliminar Eliminar Eliminar

Eliminar Eliminar Eliminar

Eliminar Eliminar Eliminar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio » Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240302433838

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

BUZÓN TRIBUTARIO

Seguimiento de los Recursos Federales

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2385100

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 122785

Estado Responsable
San Luis Potosí

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable
Xilitla

Clasificación del registro
Urbanización

Institución Ejecutora
Municipio de Xilitla

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
19/03/2024 - 21/06/2024

Mujeres
13

Número de Registro
122785

Hombres
13

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida Meta Meta Modificada Editar Eliminar

BUZÓN TRIBUTARIO x Nueva pestaña x ..Seguimiento de los Recursos Fed... x Nueva pestaña x Nueva pestaña x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2385100

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-48-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | \$1,344,169.30 | \$1,344,169.30 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

BUZÓN TRIBUTARIO x Nueva pestaña x ..Seguimiento de los Recursos Fed... x Nueva pestaña x Nueva pestaña x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2385100

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$1,344,169.30 | \$1,344,169.30 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 2024 / JUL-SEP | \$1,344,169.00 | \$1,344,169.30 | \$1,344,169.30 | \$1,344,169.30 | \$1,344,169.30 | 100.00% | Editar |
| 2024 / ABR-JUN | \$931,056.45 | \$1,344,169.30 | \$931,056.45 | \$931,056.45 | \$931,056.45 | 69.27% | ✓ Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1184

Meta Modificada: 1184

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2024 JUL-SEP | 1184 | 100% | Editar |
| 2024 ABR-JUN | 820 | 69.26% | ✓ Confirmado |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

PARA CARGAR CONTRATOS.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

https://www.mst.hacienda.gob.mx/fft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2429916

Categoría del registro

Acción
 Adquisición
 Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | |
|---|--|
| Nombre CONSTRUCCIÓN DE CALLE 6 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR VIEJO, XILITLA S.L.P. - 291909 | Estado Responsable San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable Xilitla |
| Clasificación del registro Transportes y vialidades | Institución Ejecutora Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro Sin identificar | Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| Periodo de ejecución 30/03/2024 - 17/06/2024 | Mujeres 40 |
| Número de Registro 291909 | Hombres 42 |

Metas

| Unidad de Medida | Meta | Meta Modificada | Editar | Eliminar |
|----------------------------------|-------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Metros cuadrados de construcción | 640.0 | 640.0 | Editar | Eliminar |

26°C Soleado

TERCER TRIMESTRE EG.docx - Word (Error de activación de productos)

https://www.mst.hacienda.gob.mx/fft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2429916

| Tipo de Recurso | Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|---------|---|--|-----------------|--------------|--------------|---|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$718,313.49 | \$604,384.05 | Editar Eliminar |

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| 2024 / JUL-SEP | \$604,384.05 | \$604,384.05 | \$604,384.05 | \$604,384.05 | \$604,384.05 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

| Unidad de Medida | Meta | Meta Modificada | Registrar Avance |
|----------------------------------|------|-----------------|----------------------------------|
| Metros cuadrados de construcción | 640 | 640 | Registrar Avance |

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2024 JUL-SEP | 640 | 100% | Editar |

[Cancelar](#)
[Anterior](#)
[Guardar y Continuar](#)

Página 9 de 9 6 palabras SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

26°C Soleado

PARA CARGAR CONTRATOS.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2429916

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-43-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | \$604,384.05 | \$604,384.05 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

| DO | DP | DU | DV | DW | DX |
|--------|-----------|-------|----|----|----|
| 4/2024 | 21/4/2024 | | | | |
| | | 10549 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29909 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29398 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29606 | | | |

PARA CARGAR CONTRATOS.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2429916

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Desarrollo

Termino

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

| DO | DP | DU | DV | DW | DX |
|--------|-----------|-------|----|----|----|
| 4/2024 | 21/4/2024 | | | | |
| | | 10549 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29909 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29398 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29606 | | | |

PARA CARGAR CONTRATOS.xlsx - Excel [Error de activación de productos]

Inicio Insetar

Archivos disponibles

- PARA CARGAR CONTI Versión creada del últ 21/08/2024 03:57 p. m
- PARA CARGAR CONTI Versión creada la últi 20/08/2024 05:28 p. m
- EXPEDIENTE TECNICO Versión creada del últ 21/08/2024 05:18 p. m
- EXPEDIENTE TECNICO Versión creada la últi 17/07/2024 01:37 p. m
- BD VILTILA 2024 KIKIN Versión creada del últ 15/07/2024 11:17 a. m
- avances_doraamorale Versión creada del últ 15/07/2024 11:17 a. m
- avances_doraamorale Versión creada la últi 13/07/2024 12:55 p. m
- 18. ANALITICO DE ING Versión creada la últi 15/07/2024 11:29 a. m

¿Qué archivos desea guar

Modificar Modo Filtrar

Indice ipc -0.51%

PARA CARGAR CONTRATOS

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240302429916

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

| DO | DP | DU | DV | DW | DX |
|--------|-----------|--------|----|----|----|
| 4/2024 | 21/4/2024 | | | | |
| | | 132549 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29809 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29280 | | | |
| 7/2024 | 5/7/2024 | | | | |
| | | 29026 | | | |

Buscar

ESP ES 01:03 p. m. 14/10/2024
