

DESTINO DEL GASTO SRFT 4TO. TRIM. 2024

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción
 Adquisición
 Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
| Nombre | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 386930 | Estado Responsable | San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable | Xilitla |
| Clasificación del registro | Agua y saneamiento | Institución Ejecutora | Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro | Sin identificar | Población Beneficiada | ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| Periodo de ejecución | 26/03/2024 - 18/06/2024 | Mujeres | 698 |

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$1,980,102.30

[Agregar Fuente de Financiamiento](#)

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|---|--|----------------|----------------|--------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | Eliminar |

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 2024 / OCT-DIC | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00 %**

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|
| Unidad de Medida | Metros lineales | Meta | 1171.2 | Meta Modificada | 1171.2 | Registrar Avance |
| Porcentaje Total de la Meta: 100.00% | | | | | | |
| Periodo | 2024 OCT-DIC | Avance | 1171.2 | Porcentaje | 100% | Editar |

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | IR-O-EST-XILITLA-73-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | \$1,980,102.30 | \$1,980,102.30 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar



Desarrollo



Termino



DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fed... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2464502 Actualizar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402464502

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

31°C Mayorm. soleado Buscar 03:25 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fed... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2464502 Actualizar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402464502

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. Aceptar

31°C Mayorm. soleado Buscar 03:26 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... | Seguimiento de los Recursos Fe... | (24) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468402

Actualizar

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre
ONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA S.L.P. - 396:

Estado Responsable
San Luis Potosí

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable
Xilitla

Clasificación del registro
Agua y saneamiento

Institución Ejecutora
Municipio de Xilitla

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? SI No

Periodo de ejecución
27/03/2024 - 19/06/2024

Mujeres
313

Número de Registro
396135

Hombres
289

30°C Mayom, soleado | Buscar | 03:37 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... | Seguimiento de los Recursos Fe... | (24) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468402

Actualizar

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado
\$1,285,301.25

Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|----------------|----------------|--|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 2024 / OCT-DIC | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros cúbicos

Meta: 100

Meta Modificada: 100

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|--------|
| 2024 OCT-DIC | 100 | 100% | Editar |

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

30°C Mayom, soleado | Buscar | 03:38 p. m. 13/01/2025

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamorales

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-74-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | \$1,285,301.25 | \$1,285,301.25 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

30°C Mayorm. soleado Buscar 03:38 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROV... Seguimiento de los Recursos Fe... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468402 Actualizar

Desarrollo

Termino

Termino

30°C Mayorm. soleado Buscar 03:39 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fed... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468402

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. [Aceptar](#)

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402468402

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#) [Solicita Cancelación](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

30°C Mayorm. soleado 03:42 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fed... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468070

Observaciones: **Capturista** [Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | |
|---|--|
| Nombre CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50 M3 EN LA LOCALIDAD DE TLAPEXMECAYO, XILITLA S.L.P. - 395424 | Estado Responsable San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable Xilitla |
| Clasificación del registro Agua y saneamiento | Institución Ejecutora Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro Sin identificar | Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| Periodo de ejecución 26/03/2024 - 18/06/2024 | Mujeres 50 |
| Número de Registro 395424 | Hombres 49 |

20°C Mayorm. nublado 03:49 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROY | .Seguimiento de los Recursos Fe | (24) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468070

Actualizar

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$842,681.73

Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal/ Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|---|--------------|--------------|----------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$842,681.73 | \$842,681.73 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 2024 / OCT-DIC | \$842,681.73 | \$842,681.73 | \$842,681.73 | \$842,681.73 | \$842,681.73 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

20°C Mayorm. nublado

DESTINO DEL GASTO SRFT PROY | .Seguimiento de los Recursos Fe | (24) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468070

Actualizar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-72-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | \$842,681.73 | \$842,681.73 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD


Versión 1.0

20°C Mayorm. nublado

Browser tabs: DESTINO DEL GASTO SRFT PRO... | Seguimiento de los Recursos Fe... | (24) WhatsApp | Nueva pestaña


URL: <https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468070>

Actualizar




Eliminar Eliminar Eliminar

Desarrollo



Eliminar Eliminar Eliminar

Termino



Eliminar Eliminar Eliminar

20°C Mayorm. nublado

Browser tabs: DESTINO DEL GASTO SRFT PRO... | Seguimiento de los Recursos Fe... | (24) WhatsApp | Nueva pestaña

URL: <https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2468070>

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402468070

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

20°C Mayorm. nublado

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fe... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2435264 Actualizar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre
AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LADERA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO

Estado Responsable
San Luis Potosí

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable
Xilitla

Clasificación del registro
Urbanización

Institución Ejecutora
Municipio de Xilitla

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Mujeres
389

Hombres
373

Periodo de ejecución
15/04/2024 - 13/05/2024

Número de Registro
316399

17°C Paric, soledad 04:05 p. m. 13/03/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ... ..Seguimiento de los Recursos Fe... (24) WhatsApp Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2435264 Actualizar

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado \$1,475,000.00

Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|----------------|----------------|----------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 2024 / OCT-DIC | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | 100.00% | Editar |
| 2024 / JUL-SEP | \$516,017.67 | \$516,017.67 | \$516,017.67 | \$516,017.67 | \$516,017.67 | 34.98% | Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1200

Meta Modificada: 1200

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|------------|
| 2024 OCT-DIC | 1200 | 100% | Editar |
| 2024 JUL-SEP | 420 | 35.00% | Confirmado |

17°C Paric, soledad 04:06 p. m. 13/03/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROVI x .Seguimiento de los Recursos Fe: x (24) WhatsApp x Nueva pestaña x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2435264 Actualizar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | AD-O-EST.XILITLA-60-2024 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | Municipio de Xilitla | \$1,475,000.00 | \$1,475,000.00 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

17°C Parc. soleado 04:06 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROVI x .Seguimiento de los Recursos Fe: x (25) WhatsApp x Nueva pestaña x +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2494225 Actualizar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | |
|---|--|
| Nombre CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN CALLE LOS OTATES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 451151 | Estado Responsable San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable Xilitla |
| Clasificación del registro Urbanización | Institución Ejecutora Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro | Población Beneficiada |

17°C Parc. soleado 04:26 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ: x | Seguimiento de los Recursos Fed: x | (25) WhatsApp | Nueva pestaña | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rtf-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2494225

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$121,981.30 + Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|---|--|--------------|--------------|-----------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$121,981.30 | \$121,981.30 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 2024 / OCT-DIC | \$121,981.30 | \$121,981.30 | \$121,981.30 | \$121,981.30 | \$121,981.30 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 87.15 Meta Modificada: 87.15 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|---------------------|
| 2024 OCT-DIC | 87.15 | 100% | Editar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ: x | Seguimiento de los Recursos Fed: x | (25) WhatsApp | Nueva pestaña | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rtf-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2494225

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto: Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

📍

💰

📄

📁

✅

Observaciones: **capturista**

Observaciones: **Revisión**



Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-134-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | \$121,981.30 | \$121,981.30 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

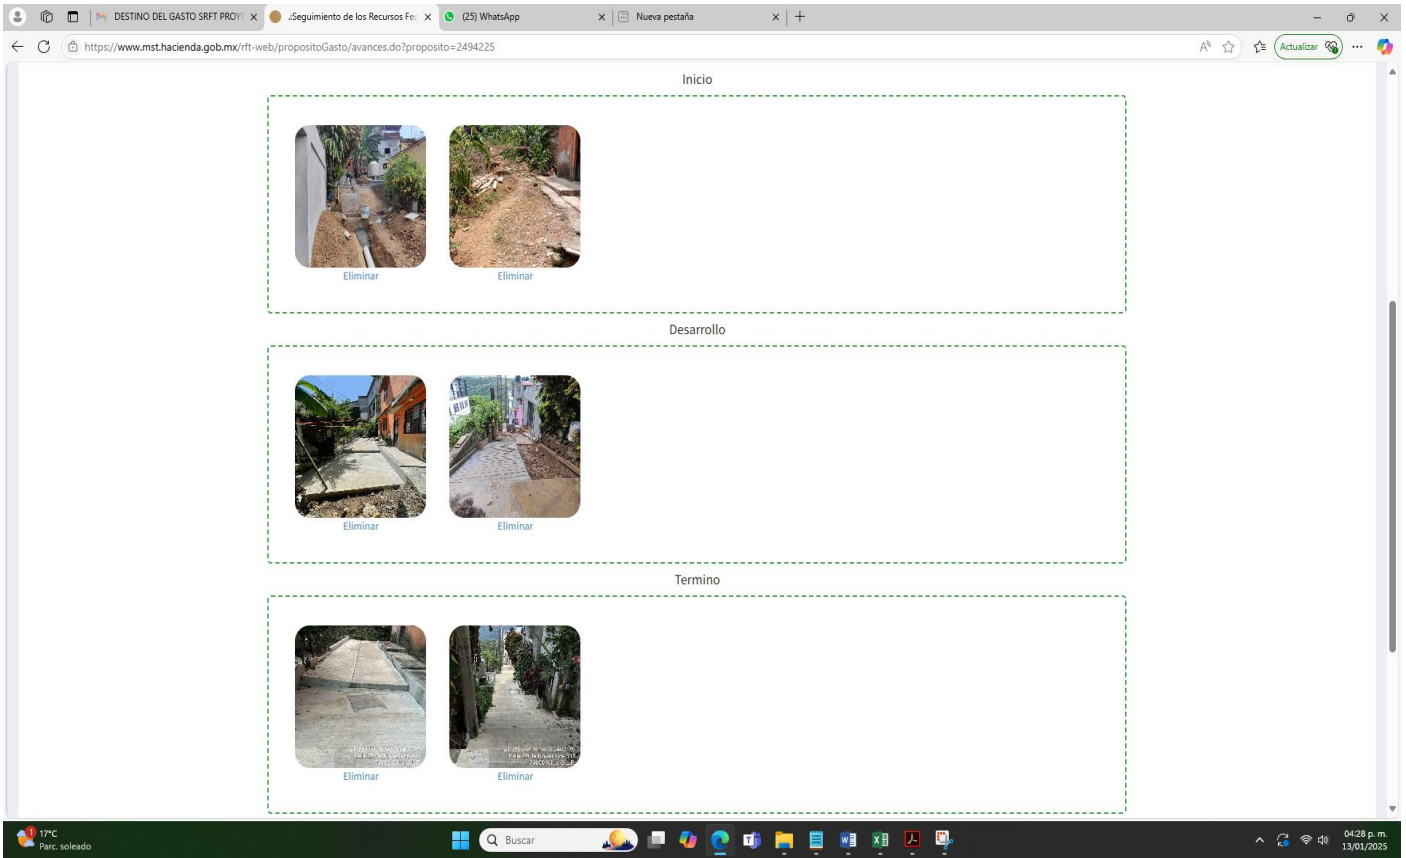

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción
 Adquisición
 Proyecto de inversión

Detalles del registro

| | |
|---|--|
| Nombre REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE CADENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 450265 | Estado Responsable San Luis Potosí |
| Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio Responsable Xilitla |
| Clasificación del registro Urbanización | Institución Ejecutora Municipio de Xilitla |
| Subclasificación del registro Sin identificar | Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| Periodo de ejecución 22/11/2024 - 21/12/2024 | Mujeres 180 |
| Número de Registro 450265 | Hombres 130 |

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$178,568.25

[Agregar Fuente de Financiamiento](#)

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$178,568.25 | \$178,568.25 | Eliminar |

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| 2024 / OCT-DIC | \$178,568.25 | \$178,568.25 | \$178,568.25 | \$178,568.25 | \$178,568.25 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 69.31

Meta Modificada: 69.31

[Registrar Avance](#)

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ | Seguimiento de los Recursos Fed... (25) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2493686

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| Obra | AD-O-EST-XILITLA-132-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | \$178,568.25 | \$178,568.25 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

17°C Parc. soleado 04:39 p. m. 13/01/2025

DESTINO DEL GASTO SRFT PROJ | Seguimiento de los Recursos Fed... (25) WhatsApp | Nueva pestaña

https://www.mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2493686

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

Eliminar Eliminar

Desarrollo

Eliminar Eliminar

Termino

Eliminar

17°C Parc. soleado 04:39 p. m. 13/01/2025

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402493686

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

17°C Parc. soleado 04:40 p. m. 13/01/2025

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado \$1,747,078.54

Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|--|----------------|----------------|----------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | \$1,747,078.54 | \$1,747,078.00 | Eliminar |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 2024 / OCT-DIC | \$1,747,078.00 | \$1,747,078.00 | \$1,747,078.00 | \$1,747,078.00 | \$712,505.87 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida Metros Cuadrados

Meta 1185

Meta Modificada 1185

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|--------|
| 2024 OCT-DIC | 1185 | 100% | Editar |

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar

17°C Parc. soleado 05:07 p. m. 13/01/2025

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

doraamoralesa

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Obra | IR-O-EST-XILITLA-148-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | \$1,747,078.00 | \$1,747,078.00 | Ver detalles | Eliminar |

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Inicio

Eliminar Eliminar Eliminar

Desarrollo

Eliminar Eliminar Eliminar

Termino

Eliminar Eliminar Eliminar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402488096

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

24°C Soleado 05:14 p. m. 13/01/2025

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto

Avances

Observaciones: **capturista**

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 2024 / OCT-DIC | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$800,000.00 | 100.00% | Editar |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00%**

Unidad de Medida: Vehículos Meta: 1 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|--------|
| 2024 OCT-DIC | 1 | 100% | Editar |

Guardar y Continuar

20°C Soleado 04:51 p. m. 15/01/2025

[Nueva pestaña](#) x [Seguimiento de los Recursos Fe...](#) x [\(25\) WhatsApp](#) x [PATRULLA XILITLA - Búsqueda](#) x [POLICIA XILITLA S.L.P. 2021-2024](#) x [Direccion General de Seguridad](#) x

<https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do>

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO **MST** **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) doraamoralesa

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto Inicio Registro Nuevo Individual

📍

\$

📄

📄

✅

Observaciones: **capturista**

[+ Agregar](#)

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Adquisiciones | ADQUISICION DE PATRULLA 2024 | PROYECT DEVELOPMENT, S.A DE C.V. | Municipio de Xilitla | \$800,000.00 | \$800,000.00 | Ver detalles | Eliminar |

[Inicio](#)
[← Anterior](#)
[Guardar y Continuar →](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

[Nueva pestaña](#) x [Seguimiento de los Recursos Fe...](#) x [\(25\) WhatsApp](#) x [PATRULLA XILITLA - Búsqueda](#) x [POLICIA XILITLA S.L.P. 2021-2024](#) x [Direccion General de Seguridad](#) x

<https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do>


Eliminar

Desarrollo


NO
DISPONIBLE

Eliminar

Termino



Eliminar



Eliminar

[Inicio](#)
[← Anterior](#)
[Guardar y Continuar →](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

doraamoralesa

Registro Nuevo Individual

Propósito del Gasto

Inicio Registro Nuevo Individual

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_SLP240402516719

Inicio Anterior **Solicitar validación**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

20°C Soleado 04:52 p. m. 15/01/2025

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

doraamoralesa

Registro Nuevo Individual

Propósito del Gasto

Inicio Registro Nuevo Individual

La acción 'Solicitar validación' se realizó correctamente. Aceptar

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_SLP240402516719

Inicio Anterior **Procesando...**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

20°C Soleado 04:53 p. m. 15/01/2025
